

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Název: **Obnova alejí podél cest v Jistebníku**



Zpracoval:


Mgr. Ivan Bartoš, Ing. Magda Cihlářová Zapletalová

Datum:

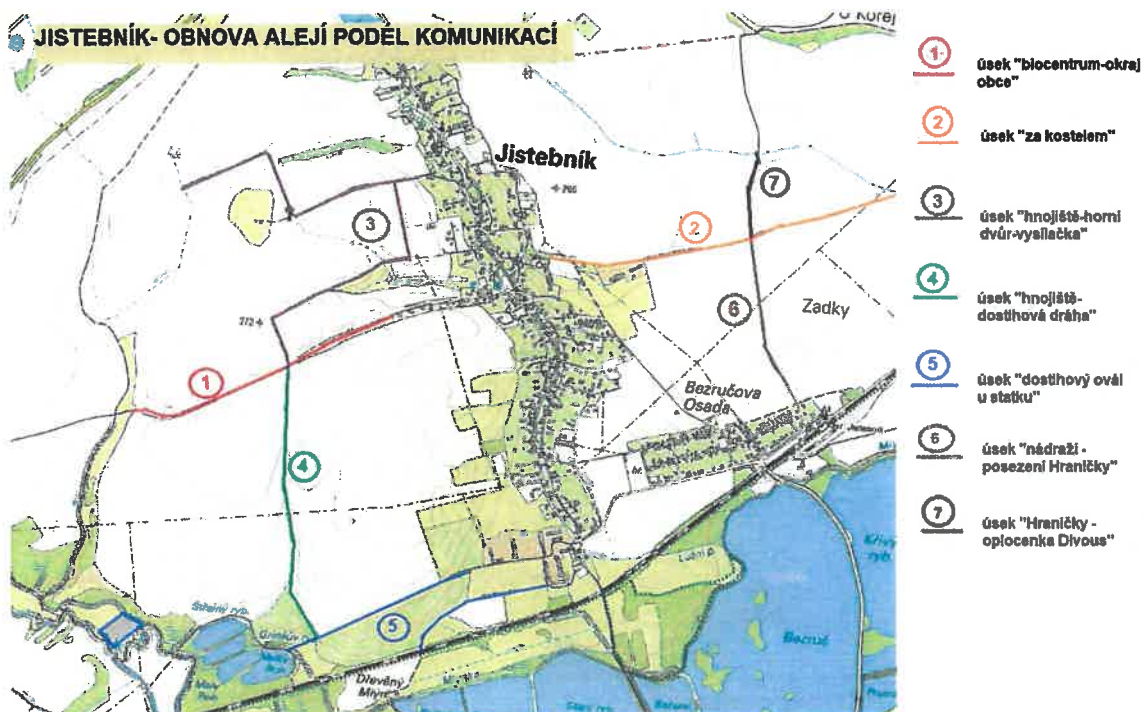

20.5.2022

1. Lokalizace záměru:

Následující parcely v k.ú. Jistebník v majetku obce:

1813, 1814, 1815, 1817, 1788, 1765, 1318/1, 2259, 1864, 1954, 1968, 2207, 2293

Přehled dotčených alejí je znázorněn na následujícím obrázku:



2. Výchozí stav

Většina stávajících polních cest v Jistebníku má zpevněný povrch a je lemována stromořadími topolů kanadských (cca 1350 ks). Tyto stromy jsou již za svým životním optimem, často jsou napadeny jmelím, výrazně se na nich projevuje prosychání korun, lámání větví a někde již dochází k pádům celých stromů. Mnohde se podél cest prosazuje nepůvodní slivoň myrobalán, která vytváří neprostupné porosty, které zasahují do komunikací svými větvemi. Jinde naopak podrůstají topolová stromořadí hodnotnými dřevinami (dubem, třešní a hlohem).

3. Cíl

- Během dvou až tří let odstranit všechny topoly kanadské a porosty myrobalánu podél cest
- Vysadit nová stromořadí ve vhodném druhovém složení
- Zachovat a vhodně ošetřit hodnotné stávající dřeviny, které již ve stromořadích vyrostly
- Vysazené stromy chránit před vytloukáním a okusem

4. Účel

- Zajistit bezpečný provoz na všech polních cestách kolem Jistebníku
- Podél komunikací obnovit či nově vytvořit funkční zeleň s nízkými nároky na údržbu a vysokou estetickou a přírodní hodnotou

5. Silné stránky

- Parcely jsou v majetku obce
- Záměr připravují osvědčení partneři: Obecní úřad Jistebník, ČSOP Studénka, Lesy Beskydy
- Záměr počítá se zapojením veřejnosti od přípravy projektů až po realizaci

6. Popis záměru

Řešením je dosluhující stromořadí topolů vykácet s cílem zachování co možná nejvíce mladých perspektivních dřevin v podrostu a výsadby nových sazenic tak, aby byla do budoucna zachována stávající stromořadí.

Vzhledem k vysokým počtům (cca 1.350ks topolů ke kácení, cca 1.000ks k nové výsadbě) se jeví vhodné rozdělit projekt na dvě etapy.

Kácení musí proběhnout v zimním období (dané ze zákona + mimo polní práce a vegetační sezónu).

Aktivita projektu v časové posloupnosti:

- Schválení záměru zastupitelstvem obce
- Vyhlášení záměru
- Konzultace s vlastníky a nájemci sousedících pozemků
- Konzultace s místními spolky a ostatní veřejností (upřesní druhovou skladbu i zájem veřejnosti podílet se na výsadbách i údržbě)
- Vyhotovení realizačního projektu
- Zveřejnění projektu, publicita
- Získání souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody
- Označení dřevin, které budou ponechány
- Odstranění topolů 1. etapa
- Odstranění křovin myrobalánu a nepoužitelného náletu dalších dřevin
- Výsadby dřevin 1. etapa
- Odstranění topolů 2. etapa
- Výsadby dřevin 2. etapa
- Údržba vysazených dřevin
- Odstranění křovin myrobalánu a nepoužitelného náletu dalších dřevin
- Výsadba dřevin „navazující projekt“

Odhadovaná doba realizace: 2-3 roky

Návrh etap a popis jednotlivých úseků:

1. ETAPA

Úsek 1: biocentrum – okraj obce

- Dotčené parcely: 1813, 1814, 1815, 1817
- Délka linie: 1.000 m
- Hrubý počet topolů ke kácení: 140ks
- Odhad výsadby: oboustranně – nově bude vysazeno cca 60% délky, na 40% budou zachovány nově vyrostlé místní dřeviny,
- Odhadovaný počet stromů k výsadbě: 100ks

Úsek 2: za kostelem

- Dotčené parcely: 1318/1, 2259
- Délka linie: 1.800 m
- Hrubý počet topolů ke kácení: 90ks
- Odhad výsadby – okraj obce – posezení 60% (jedna strana, druhá strana – vykácet topoly i myrobalán, odclonit hrušně), posezení – hranice katastru 100% oboustranně
- Odhadovaný počet stromů k výsadbě: 200ks

Úsek 3: hnojiště – horní dvůr – vysílačka

- Dotčené parcely: 1788, 1765
- Délka linie: 2.500 m
- Hrubý počet topolů ke kácení: 460ks
- Odhad výsadby – dle podmínek na jednotlivých částech
- Odhadovaný počet stromů k výsadbě: 266ks

2. ETAPA

Úsek 4: hnojiště – zatáčka u dostihové dráhy

- Dotčené parcely: 1864 (část)
- Délka linie: 1.200 m
- Hrubý počet topolů ke kácení: 267ks
- Odhad výsadby – 100%, oboustranně
- Odhadovaný počet stromů k výsadbě: 200ks

Úsek 5: dostihový ovál u statku

- Dotčené parcely: 1864 (zbývající část), 1954, 1968
- Délka linie: 1.600 m
- Hrubý počet topolů ke kácení: 400ks
- Odhad výsadby – rybníky Rohy – zatáčka 20%, kolem dostihové dráhy 100%, u trati 50% oboustranně
- Odhadovaný počet stromů k výsadbě: 217ks

NAVAZUJÍCÍ PROJEKT

Úsek 6: nádraží – posezení Hraničky

- Parcela 2207
- Nutno vykácet myrobalán, odclonit stávající hrušně + dosadba nových hrušní
- Délka linie: 800m
- Odhad výsadby – 40%
- Odhadovaný počet stromů k výsadbě: 40ks

Úsek 7: posezení Hraničky – oplocenka

- Parcela 2293
- Dosadba kolem polní cesty, jen levá strana
- Délka linie: 380m
- Odhad výsadby: 100% (jen levá strana)
- Odhadovaný počet stromů k výsadbě: 30ks

SHRNUTÍ:

Odhadovaný počet topolů ke kácení:

- 1. etapa: 690 ks
- 2. etapa: 667 ks

Odhadovaný počet stromů k výsadbě:

- 1. etapa: 566ks
- 2. etapa: 417ks
- Navazující projekt: 70ks

7. Náklady a financování

Náklady na kácení topolů budou kompenzovány prodejem dřeva z pokácených stromů. Tato část bude plně v režii firmy, která bude kácení provádět.

Hrubý odhad nákladů na výsadbu (jen výsadba = stromy, ochrany, práce – 1.500,- Kč/ks):

- 1. etapa: 850.000,- Kč
- 2. etapa: 625.000,- Kč
- Navazující projekt: 105.000,- Kč

Není zahrnuta následná péče o vysazené dřeviny, není zahrnuto kácení myrobalánu a odclonění stávajícího porostu.

Možné způsoby financování:

- OPŽP, NPŽP
- POPFK, PPK
- nadace a firemní zdroje
- obecní rozpočet
- MAS Regionu Poodří

